SWVCC LRC
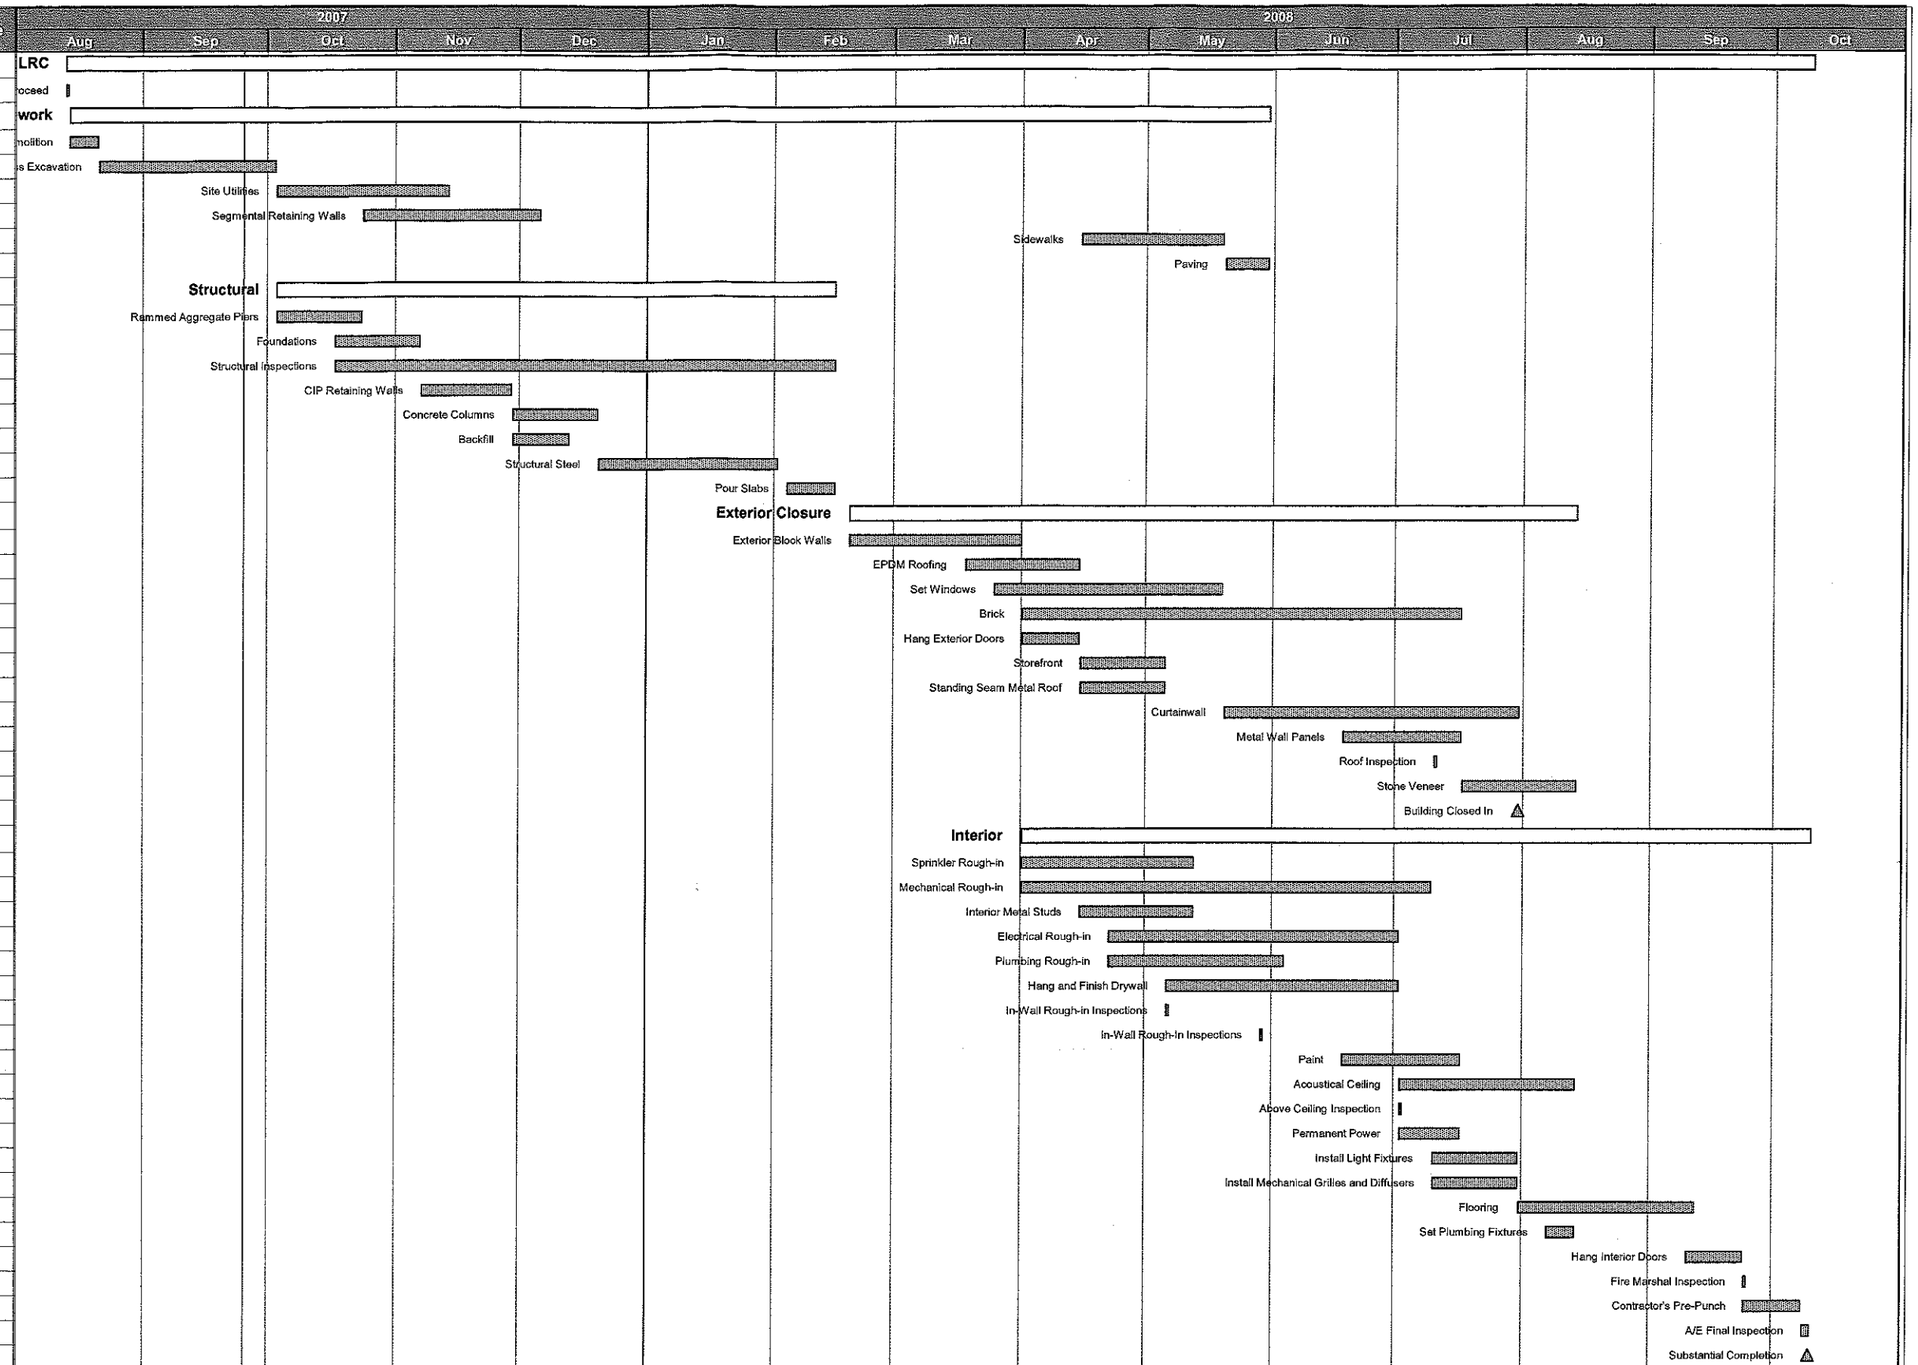
Task Name	Start Date	Duration	End Date
SWVCC LRC	**8/13/2007**	**296.00d**	**10/9/2008**
Notice to Proceed	8/13/2007	1.00d	8/13/2007
Sitework	**8/14/2007**	**203.00d**	**5/30/2008**
Site Demolition	8/14/2007	5.00d	8/20/2007
Mass Excavation	8/21/2007	30.00d	10/2/2007
Site Utilities	10/3/2007	30.00d	11/13/2007
Segmental Retaining Walls	10/24/2007	30.00d	12/5/2007
Sidewalks	4/15/2008	25.00d	5/19/2008
Paving	5/20/2008	8.00d	5/30/2008
Structural	**10/3/2007**	**95.00d**	**2/15/2008**
Rammed Aggregate Piers	10/3/2007	15.00d	10/23/2007
Foundations	10/17/2007	15.00d	11/6/2007
Structural Inspections	10/17/2007	85.00d	2/15/2008
CIP Retaining Walls	11/7/2007	15.00d	11/28/2007
Concrete Columns	11/29/2007	15.00d	12/19/2007
Backfill	11/29/2007	10.00d	12/12/2007
Structural Steel	12/20/2007	30.00d	2/1/2008
Pour Slabs	2/4/2008	10.00d	2/15/2008
Exterior Closure	**2/19/2008**	**125.00d**	**8/13/2008**
Exterior Block Walls	2/19/2008	30.00d	3/31/2008
EPDM Roofing	3/18/2008	20.00d	4/14/2008
Set Windows	3/25/2008	40.00d	5/19/2008
Brick	4/1/2008	75.00d	7/16/2008
Hang Exterior Doors	4/1/2008	10.00d	4/14/2008
Storefront	4/15/2008	15.00d	5/5/2008
Standing Seam Metal Roof	4/15/2008	15.00d	5/5/2008
Curtainwall	5/20/2008	50.00d	7/30/2008
Metal Wall Panels	6/18/2008	20.00d	7/16/2008
Roof Inspection	7/10/2008	1.00d	7/10/2008
Stone Veneer	7/17/2008	20.00d	8/13/2008
Building Closed In	7/30/2008	0d	7/30/2008
Interior	**4/1/2008**	**135.00d**	**10/9/2008**
Sprinkler Rough-in	4/1/2008	30.00d	5/12/2008
Mechanical Rough-in	4/1/2008	70.00d	7/9/2008
Interior Metal Studs	4/15/2008	20.00d	5/12/2008
Electrical Rough-in	4/22/2008	50.00d	7/1/2008
Plumbing Rough-in	4/22/2008	30.00d	6/3/2008
Hang and Finish Drywall	5/6/2008	40.00d	7/1/2008
In-Wall Rough-in Inspections	5/6/2008	1.00d	5/6/2008
In-Wall Rough-In Inspections	5/29/2008	1.00d	5/29/2008
Paint	6/18/2008	20.00d	7/16/2008
Acoustical Ceiling	7/2/2008	30.00d	8/13/2008
Above Ceiling Inspection	7/2/2008	1.00d	7/2/2008
Permanent Power	7/2/2008	10.00d	7/16/2008
Install Light Fixtures	7/10/2008	15.00d	7/30/2008
Install Mechanical Grilles and	7/10/2008	15.00d	7/30/2008
Flooring	7/31/2008	30.00d	9/11/2008
Set Plumbing Fixtures	8/7/2008	5.00d	8/13/2008
Hang Interior Doors	9/10/2008	10.00d	9/23/2008
Fire Marshal Inspection	9/24/2008	1.00d	9/24/2008
Contractor's Pre-Punch	9/24/2008	10.00d	10/7/2008
A/E Final Inspection	10/8/2008	2.00d	10/9/2008
Substantial Completion	10/9/2008	0d	10/9/2008
